

東名高速道路上の跨道橋（西阿知和橋）を多軸式特殊台車を用いて架設をしました

【工事名】：岡崎市阿知和地区工業団地造成事業 西阿知和橋新設工事

令和7年7月12日（土）から令和7年7月13日（日）の夜間にかけて、東名高速道路（上下線）豊田JCT～岡崎IC間を夜間通行止め規制し、跨道橋の架設を行いました。本工事は、岡崎市による岡崎市阿知和地区工業団地造成事業の一環として、橋梁を架け替える工事です。


本社工場で製作した橋桁を架設地点から離れた場所までトレーラーにて輸送した後、地組立を行いました。地組立場所から架設地点への約100mを多軸式特殊台車にて運搬し、ユニットジャッキを昇降させることにより、橋桁を架設しました。

工事関係者並びに近隣住民の方々のご協力により安全に施工ができました。この場をお借りして感謝申し上げます。

① 高速道路への進入



② 高速道路上を移動

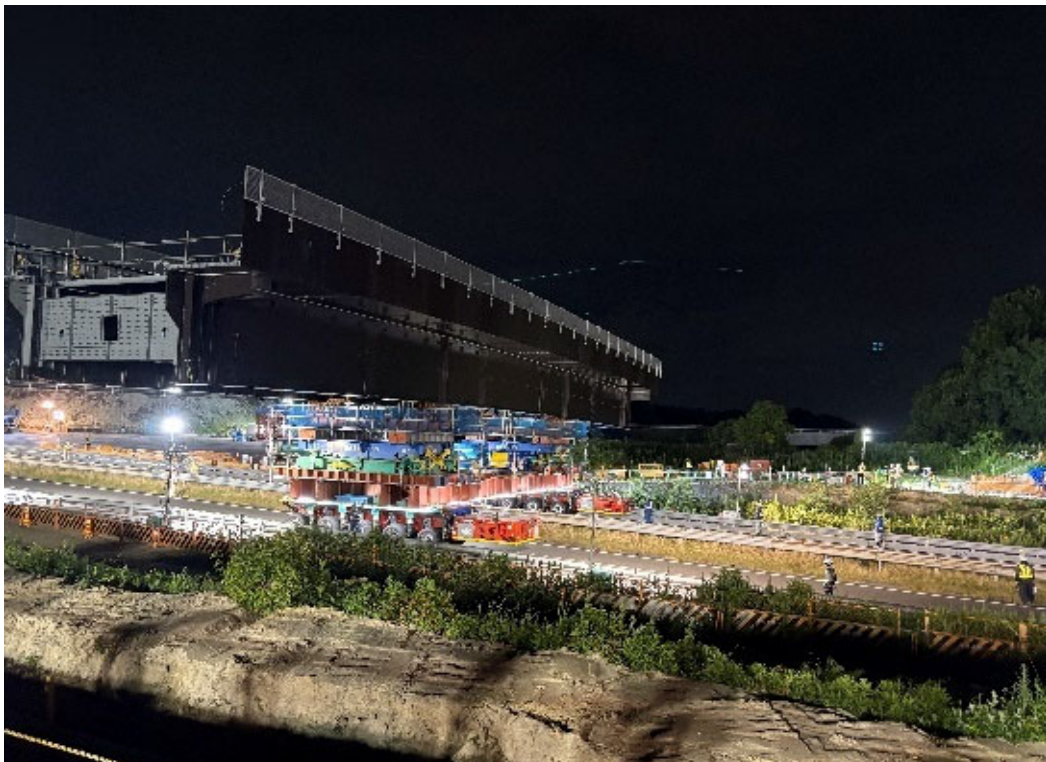

③ 架設地点到着



④ 架設完了

